三陸沿岸道路（野田久慈道路）
普代～久慈　工事状況お知らせ　第13版

がんばろう！東北　復興道路

【平成２７年７月末 現在】

東北地方整備局　三陸国道事務所
三陸沿岸道路　普代久慈工区　安全衛生連絡協議会

●野田久慈道路より、お知らせが裏面にありますので、そちらもご参照下さい。

⑦ 白井・普代地区【国道４５号　白井地区道路工事】
鹿島建設㈱

橋台を作るための、土留工事を施工中です。（普代地区）

橋台を作るための、掘削と土留工事を施工中です。（野田地区）

② 野田地区【野田ＩＣ橋橋台工事】
㈱新井組

橋台両側の擁壁が概ね完了しました。

⑤ 野田地区【秋田地区道路改良工事】
南建設㈱

工事が完了しました。
ご協力ありがとうございました。

① 宇部地区【国道４５号　宇部トンネル工事】
大日本土木㈱

起点側本線道路部の掘削と覆工コンクリートの施工を行っています。8月25日に貫通式を執り行います。

本線道路部の土砂と岩を掘削し、洋野町種市へ運搬しています。

⑥ 宇部地区【久慈宇部ＩＣ道路工事】
㈱新井組

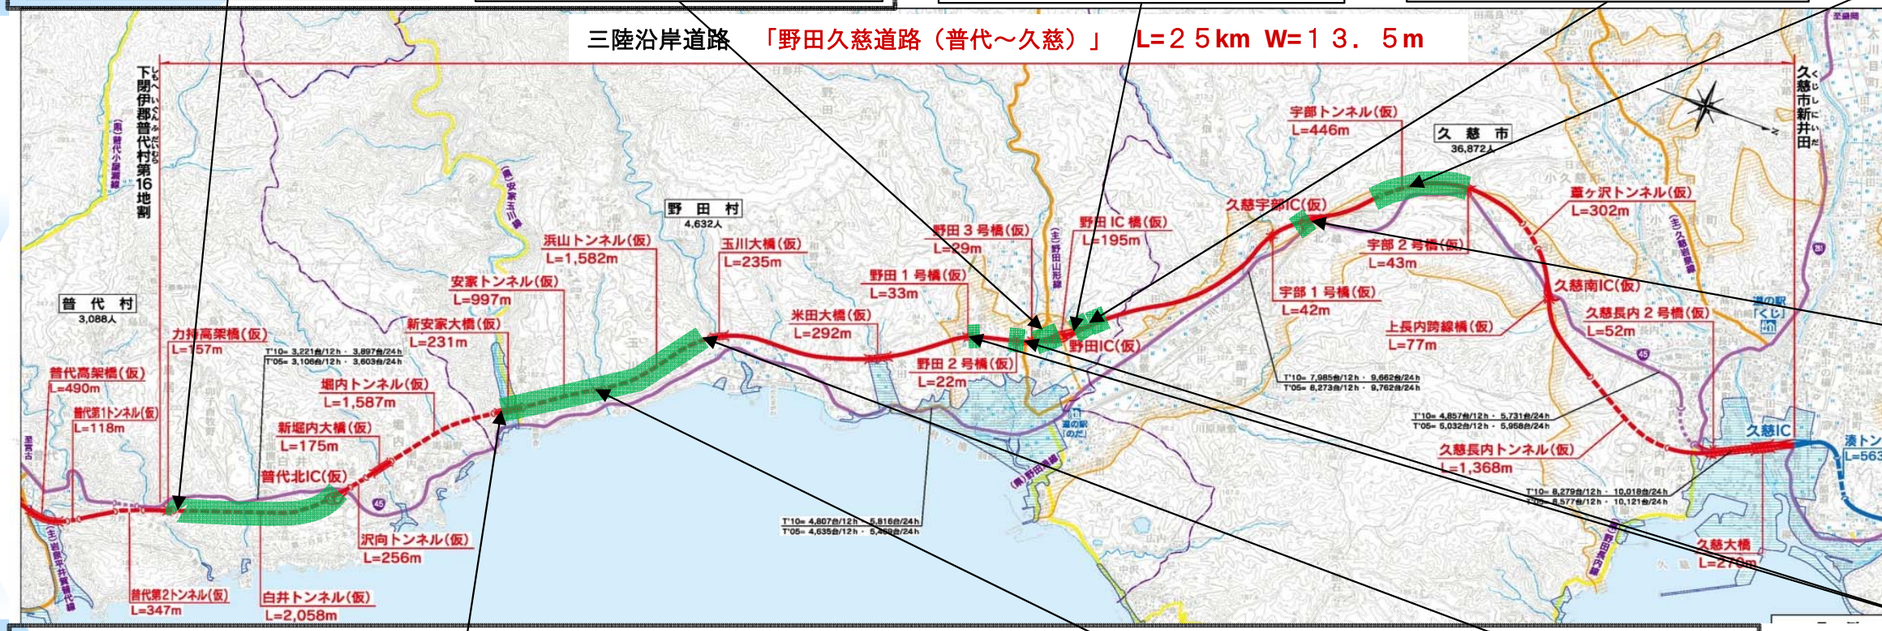

凡　例
工事箇所

右岸、左岸ともに新安家大橋の土台となるケーソン（箱型のコンクリート構造物）の施工を開始しました。

③下安家地区【国道４５号　下安家道路工事　　戸田・大豊特定建設工事共同企業体

安家トンネル終点側の切土を行っています。

浜山トンネル坑口より130m（全長1582m）地点を掘削中です。

野田１号橋Ａ2橋台が完了し、函渠の土留工を施工しています。

④ 野田地区【野田地区橋梁下部工工事】
宮城建設㈱

三陸沿岸道路（普代～久慈）

復興道路

野田久慈道路だより

H２７年８月３日

野田久慈道路　路線概要

三陸沿岸道路「野田久慈道路（普代～久慈）」は、普代村第１６地割から久慈市新井田を結ぶ約２５kmの自動車専用道路です。

現道の線形不良区間を回避し、走行性が向上するとともに、所要時間の短縮により救援物資の輸送拠点となる久慈港と宮古市間のアクセス性向上、救急医療施設への速達性向上等の効果が期待されます。

野田久慈道路　工事箇所一覧

	工事名	受注者（電話番号）	主な工事内容	ダンプマスクの色
①	国道４５号宇部トンネル工事	大日本土木(株)　(0194-75-4622)	トンネル工、函渠工	－
②	野田IC橋橋台工事	(株)新井組　(0194-75-3763)	橋台工	－
③	国道４５号下安家道路工事	戸田・大豊JV　(0194-36-1250)	トンネル工、函渠工	三陸沿岸道路
④	野田地区橋梁下部工工事	宮城建設(株)　(0194-78-2515)	橋台工、函渠工	三陸沿岸道路
⑤	秋田地区道路改良工事	南建設(株)　(0194-75-3578)	切土工	三陸沿岸道路
⑥	久慈宇部IC道路工事	(株)新井組　(0194-75-3658)	函渠工、切土工	三陸沿岸道路
⑦	国道４５号白井道路工事	鹿島建設(株)　(0194-36-1570)	トンネル工、橋台工、橋脚工	三陸沿岸道路

■野田ＩＣ橋橋台工事が工事完了を迎えます

株式会社新井組

【工事着手前】

【久慈側から普代方面を望む】

【橋台工・擁壁工】

日頃より、地域住民の皆様方には三陸沿岸道路事業に深いご理解とご協力を頂き、厚くお礼申し上げます。

「野田IC橋橋台工事」は、終盤を迎えています。主な工事内容は、山の部分の掘削工事、橋台１基とその両側に位置する擁壁工事です。

昨年の８月より、野田村第２４地割地内にて工事を着手しました。１年以上にわたり、住民の皆様方には、多大な迷惑、ご不便をお掛けし誠に申し訳ありませんでした。皆様方のご理解とご協力により、ようやく完成間近となりました。本当にありがとうございます。

残り僅かとなりますが、引続き気を引き締めて参りますので、何卒宜しくお願いいたします。

今後とも、三陸沿岸道路の事業に、ご理解とご協力のほど重ねてお願い申し上げます。

（工事責任者　小酒井）

（東海林）

（成田）

道路に異常を発見したときの緊急通報……＃9910へ
（道路に穴が開いている、道路が通れないなど緊急を要する場合）

地域とともに 三陸国道事務所
国道45号、仙人峠道路、三陸沿岸道路
宮古盛岡横断道路を担当しております。

工事現場を見学しませんか？　がんばろう！東北

記者発表　さんこくニュース　お知らせ　入札・契約情報　組・地域情報　事務所情報　リンク集

三陸国道事務所HPから申し込み出来ます。申し込みをお待ちしています！

のだくじどうろTOPICS

下安家道路工事
インフォメーションセンターがオープンしました。

国道４５号下安家道路工事の施工者である戸田・大豊特定建設工事共同企業体が、復興道路の工事インフォメーションセンターを平成27年7月16日、浜山トンネル工事現場敷地内に開設しました。

インフォメーションセンターは、トンネル工事や橋梁工事をベースに、工事の進捗状況、工事に使用した新技術や新工法の紹介などを地域の皆さまに情報発信していきます。

また、開設日にあわせ野田中学校１年生の皆さんが、現場見学を行いました。

インフォメーションCの看板を掲げる、金濱監督官と戸田・大豊JV佐々木所長

開設期間
- 平成27年7月～平成29年３月（予定）
  一般公開は毎週土曜日10時～15時まで
  工事見学会等で来訪された場合は適宜公開

問い合わせ先
- 三陸国道事務所　TEL0193-62-1711（代表）
- 戸田・大豊JV　TEL0194-36-1250

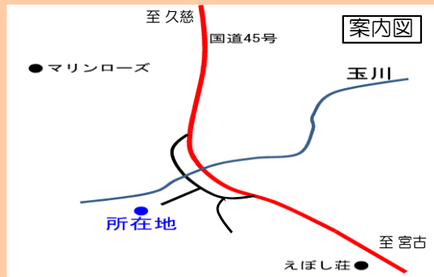

映像で工事状況を観る生徒さん

模型を見ながらトンネル工事の説明を受ける生徒さん

展示物



来館を歓迎する黒板

鉄筋の数々

コンクリートの材料

センター内見取り図

トンネル工事で使用する防塵マスクやプロテクターなど

工事説明パネルで浜山トンネルの説明を受ける生徒さん
